


EX STABILIMENTO INDUSTRIALE ISOCHIMICA

PROGETTO PER LA RIMOZIONE DEI SILOS, IMPIANTI, GRU E DI ALCUNI CUBI DI CEMENTO CONTENENTI AMIANTO

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	1	Allestimento del cantiere			5
2	2	Sfalcio e rimozione vegetazione			6
3	3	Sistemaizone ingressi e viabilità di cantiere			6
4	4	Realizzazione area per la lavorazione dei silos			3
5	5	Pulizia, rimozione strutture in ferro e rinforzo strutturale con FRP del silos			20
6	6	Rimozione tubi ed impianti di probabile aspirazione ubicati tra i due silos			15
7	7	Rimozione, taglio e smaltimento a discarica del silos maggiore			20
8	8	Rimozione, taglio e smaltimento in discarica del silos minore			20
9	9	Smontaggio e trasporto a rifiuto gru			5
10	10	Rimozione e trasporto a discarica di 15 cubi in cemento contenenti amianto			10
11	11	Smobilizzo del cantiere			5

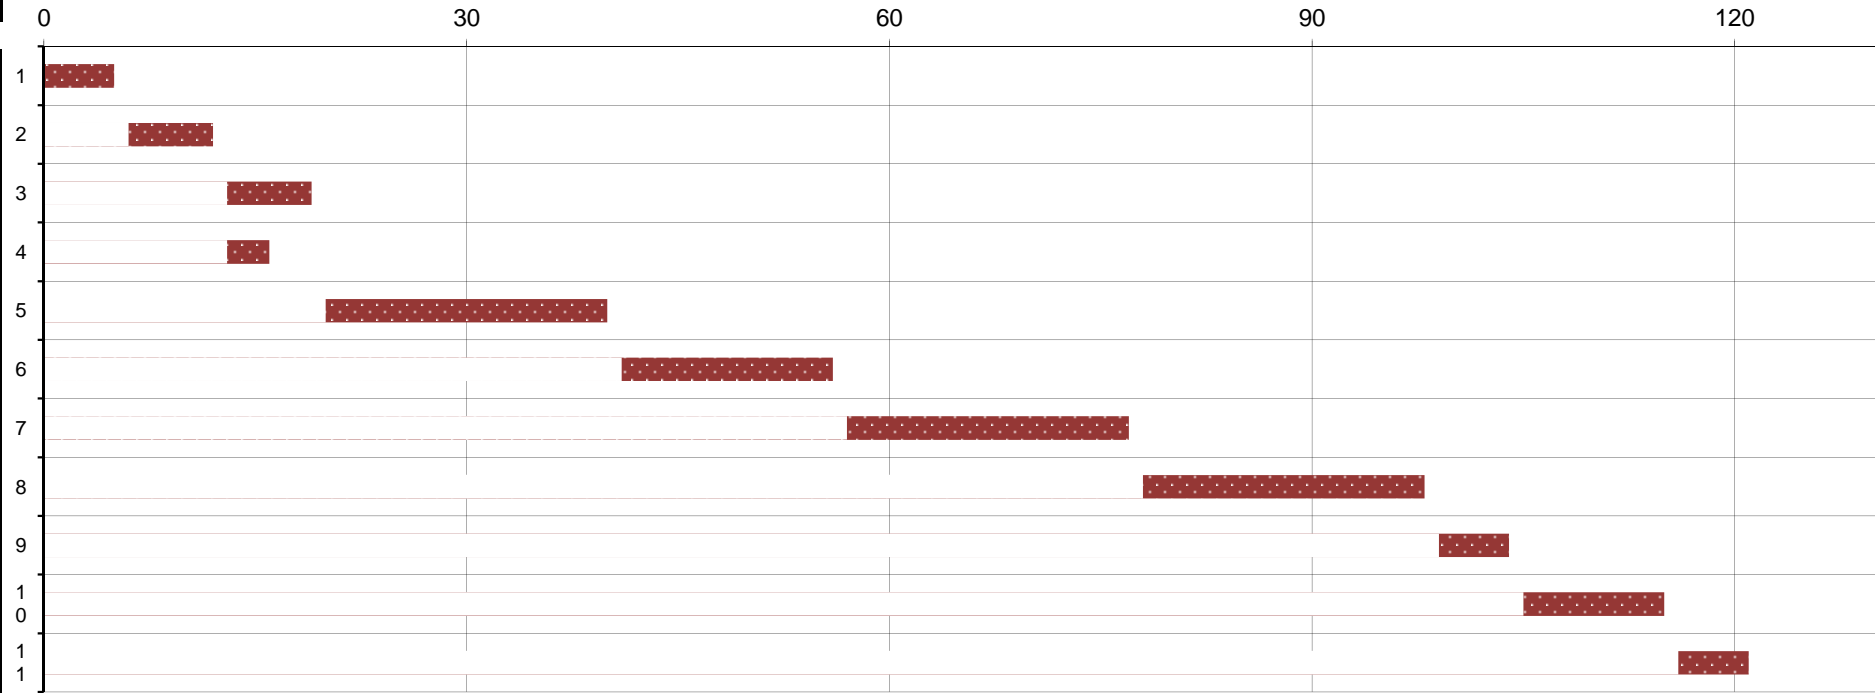

TC

121 gg.  
naturali consecutivi

Fine lavori

121 gg
